

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

- ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 35,468,300 บาท

- สิ่งก่อสร้าง จำนวน 5,427,900 บาท


งบประมาณทั้งหมด 40,896,200 บาท

กราฟสรุปการบริหารสัญญา (รายการครุภัณฑ์) ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564

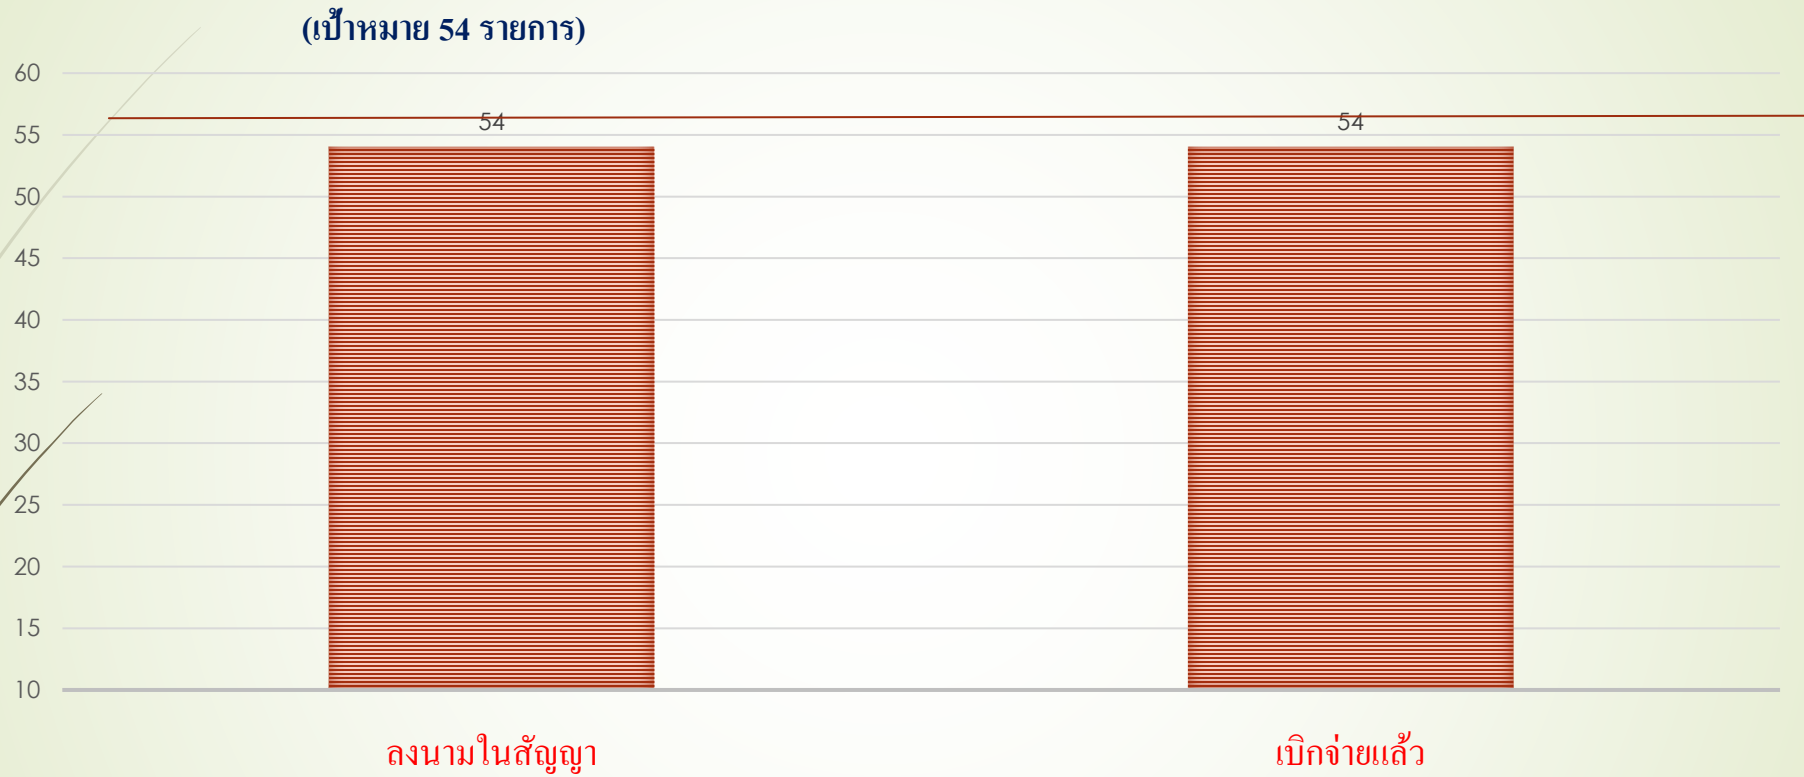

หมายเหตุ : วงเงิน PO รายการครุภัณฑ์ จำนวน 54 รายการ เท่ากับ 35,284,628 บาท
เบิกจ่าย 35,284,628 บาท
เท่ากับ 100 %


กราฟสรุปการบริหารสัญญา (รายการสิ่งก่อสร้าง) ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564

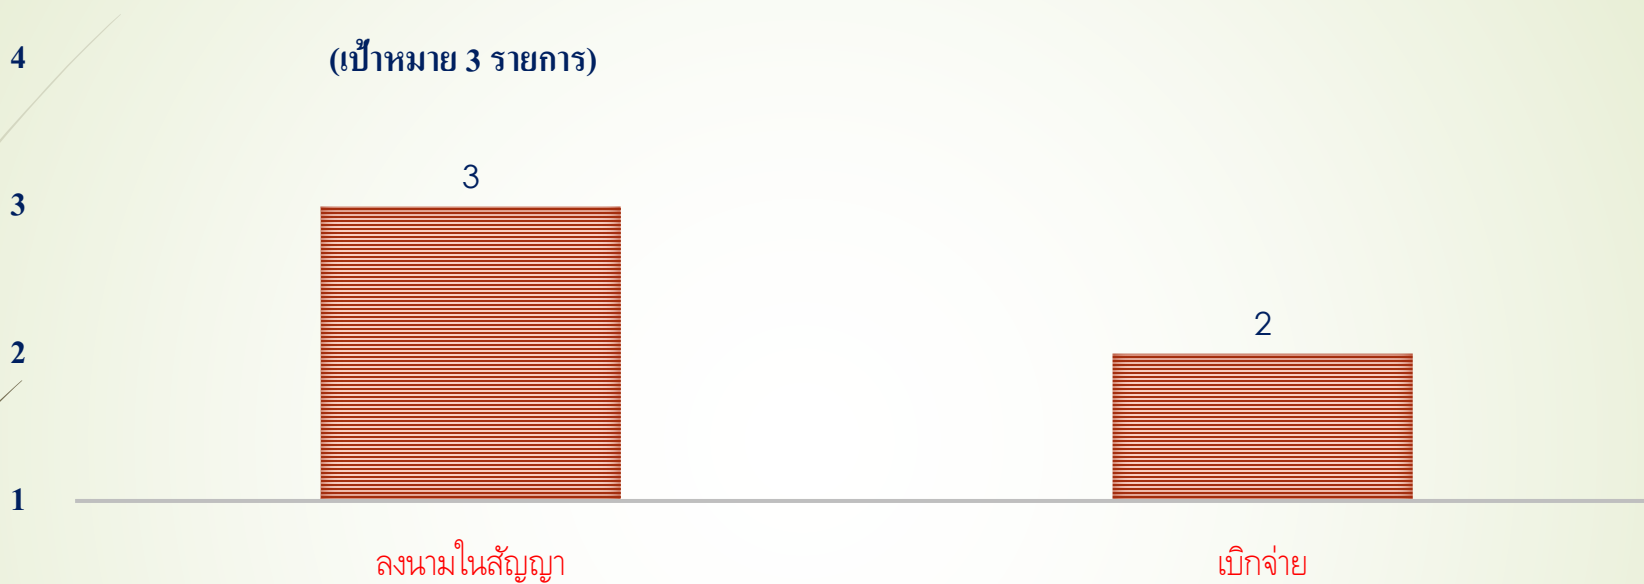

หมายเหตุ วงเงิน PO รายการครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ เท่ากับ 5,230,400 บาท
เบิกจ่าย 3,545,600 บาท
เท่ากับ 67.78 %

รายการคงค้าง บ้านพัก รพ.สต.บ้านเกาะหมากน้อย วันสิ้นสุดสัญญา วันที่ ๔ สค. ๖๔
(อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ ๒)
เนื่องจากบริษัทยินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไข และส่งแผนงานก่อสร้าง

- ส่งมอบงานงวดที่ ๑ (คงเหลือ ๔ งวด)
- เบิกจ่ายเงิน ๒๖๕,๒๐๐.- บาท



สรุปจำนวนเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

- วงเงินรวมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง (PO) 40,515,028 บาท
- เบิกจ่ายแล้ว 38,830,228 บาท
- คงเหลือ 1,684,800 บาท (บ้านพัก รพ.สต.บ้านเกาะหมากน้อย)
- เท่ากับ 95.84 %


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา



งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- ค่าครุภัณฑ์ (17 รายการ) จำนวน 5,041,500 บาท**
- สิ่งก่อสร้าง (2 รายการ) จำนวน 5,110,300 บาท**
- งบประมาณทั้งหมด 10,151,800 บาท**

กราฟสรุปการบริหารสัญญา รายการครุภัณฑ์ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564

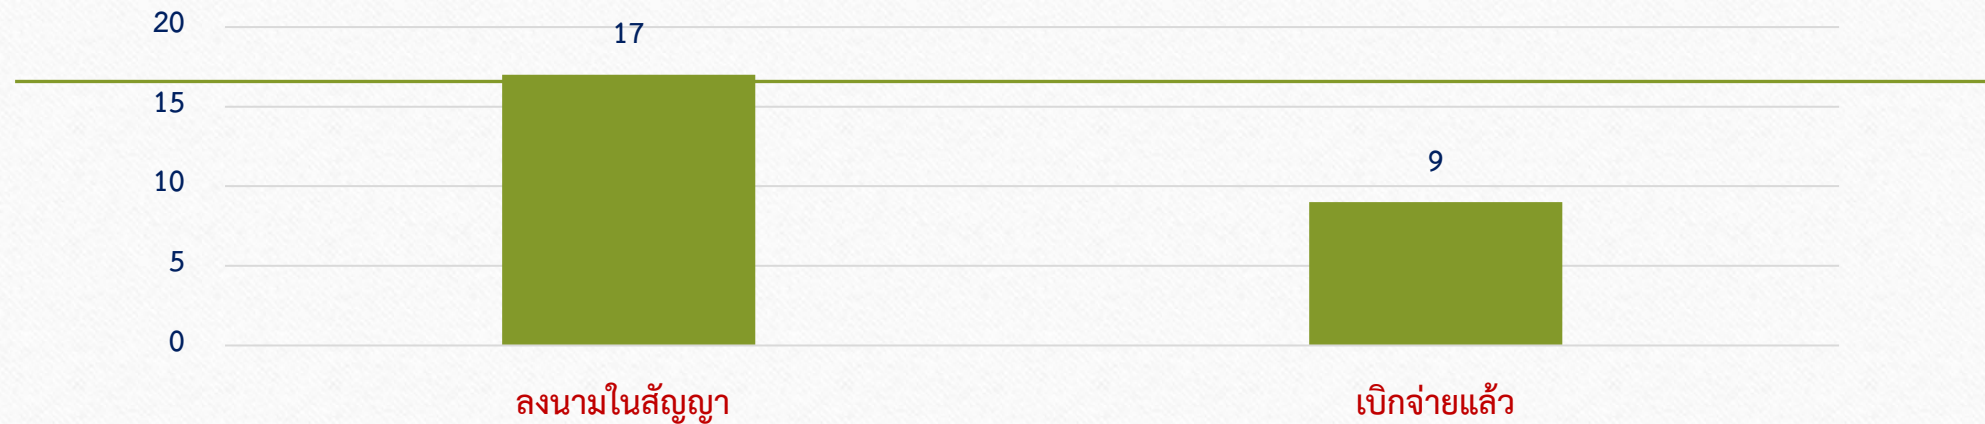

หมายเหตุ : วงเงิน PO รายการครุภัณฑ์ จำนวน 17 รายการ เท่ากับ 5,005,500 บาท
จำนวน 9 รายการ เบิกจ่าย 1,647,200 บาท
เท่ากับ 32.91 %

รายการครุภัณฑ์คงเหลือ จำนวน 8 รายการ ดังนี้

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	วงเงิน PO	ชื่อหน่วยบริการ
1	เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 50 ปอนด์	1 เครื่อง	268,000	โรงพยาบาลบางไทร
2	เครื่องตรวจสอบสมรรถภาพปอด	1 เครื่อง	250,000	โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒนา
3	เครื่องนั่งฆ่าเชื้อโรค สำหรับด้ามกรอพื้น	1 เครื่อง	150,000	โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒนา
4	ตู้ดูดไอสารเคมี Fume Hood ครอบอ่างพร้อมฐาน	1 ตู้	145,000	โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒนา
5	เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์	1 เครื่อง	757,000	โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒนา
6	เครื่องช่วยกระบวนการป้อนและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย	1 เครื่อง	998,000	โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง
7	เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์ 100 % แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร	1 เครื่อง	775,000	โรงพยาบาลทับปุด
8	จอร์บภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว	1 จอ	15,300	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพังงา
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น			3,358,300	

รายงานความก้าวหน้าขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อ รายการสิ่งก่อสร้าง

ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง



หมายเหตุ

1 = คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง

2 = รายงานผลราคากลาง

3 = รายงานขอซื้อขอจ้าง

4 = ประกาศผู้ชนะ

5 = ลงนามในสัญญา

ห้อง Modified AIIR และพร้อมห้อง
พ่นยาผู้ป่วยทางเดินหายใจ

อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 1

ประกาศจัดจ้างครั้งที่ 2 เนื่องจากครั้งที่ 1 ไม่มีผู้เสนอราคา

สรุปเบิกจ่ายเงินรายการครุภัณฑ์ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564

-
- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| • ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 5,005,500 บาท | - สั่งก่อสร้าง จำนวน 5,080,000 บาท |
| • เบิกจ่ายเงินแล้ว 1,647,200 บาท | - เบิกจ่ายเงินแล้ว 0 บาท |
| • คงเหลือ 3,358,300 บาท | - คงเหลือ 5,080,000 บาท |
| • คิดเป็น 32.91 % | - คิดเป็น 0 % |

สรุปรายการเบิกจ่ายครุภัณฑ์และสั่งก่อสร้าง (วงเงิน PO 10,085,500.- บาท)

คิดเป็น 16.33 %

ขอบคุณครับ




งบเงินกู้เพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับ
ผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เบื้องต้น)

รายการก่อสร้าง วงเงิน 13,441,800.- บาท

รายการครุภัณฑ์ วงเงิน 18,529,000.- บาท

รวมทั้งสิ้น 31,970,800.- บาท

กราฟสรุปแสดงการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564

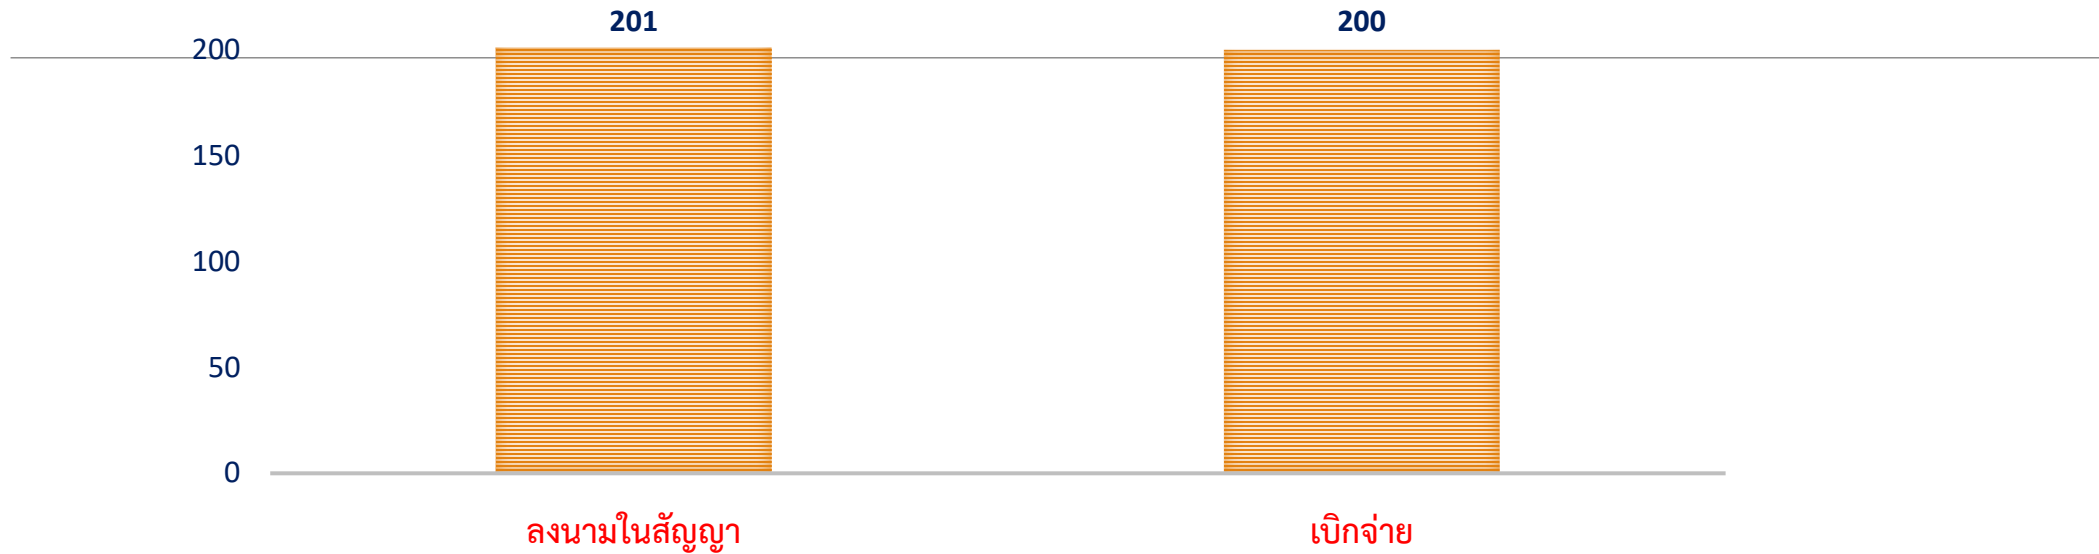


หมายเหตุ : วงเงิน PO รายการครุภัณฑ์ จำนวน 201 รายการ เท่ากับ 18,237,200 บาท
เบิกจ่าย 16,938,200 บาท
เท่ากับ 92.88 %

คงเหลือ 1 รายการ วงเงิน 1,299,000 บาท

1. เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 1,299,000 บาท (รพ.ตะกั่วทุ่ง)
- ตรวจรับครั้งที่ 1 (มติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ตรวจรับ)

กราฟสรุปแสดงการจัดซื้อจัดจ้างรายการสิ่งก่อสร้าง ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564

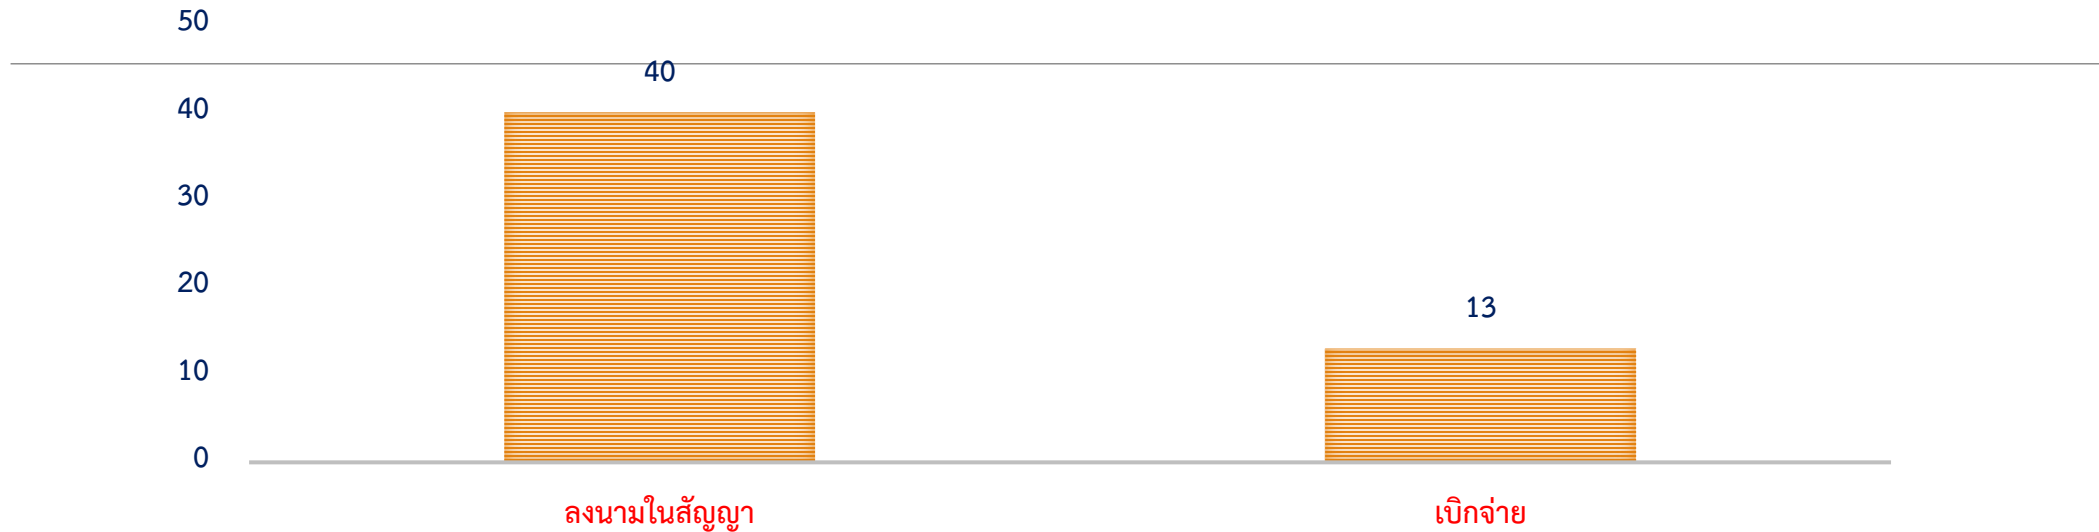

หมายเหตุ : วงเงิน PO สิ่งก่อสร้าง จำนวน 40 รายการ เป็นเงิน 12,571,400 บาท
เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน 13 รายการ เป็นเงิน 1,944,500 บาท
เท่ากับ 15.47 %

คงเหลือ จำนวน 27 รายการ เป็นเงิน 10,626,900 บาท

รายการคงเหลือ ดังนี้

1. งานปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม TYPE B คงเหลือ จำนวน 20 รายการ (2,978,200 บาท)

- 1.1 สสอ.ตะกั่วป่า จำนวน 5 แห่ง อยู่ระหว่างนัดตรวจรับงาน (ส่งมอบงานแล้ว รอส่งเอกสารเบิกจ่ายเงิน)
- 1.2 สสอ.กระบี่ จำนวน 2 แห่ง อยู่ระหว่างนัดตรวจรับงาน (ส่งมอบงานแล้ว รอส่งเอกสารเบิกจ่ายเงิน)
- 1.3 สสอ.ท้ายเหมือง จำนวน 5 แห่ง ตรวจรับงานแล้ว (ส่งมอบงานแล้ว รอส่งเอกสารเบิกจ่ายเงิน)
- 1.4 สสอ.กะปง จำนวน 3 แห่ง อยู่ระหว่างนัดตรวจรับงาน (ส่งมอบงานแล้ว รอส่งเอกสารเบิกจ่ายเงิน)
- 1.5 สสอ.เกาะยาว จำนวน 1 แห่ง อยู่ระหว่างนัดตรวจรับงาน (ส่งมอบงานแล้ว รอส่งเอกสารเบิกจ่ายเงิน)
- 1.6 รพ.กระบี่ชัยพัฒนา จำนวน 1 แห่ง ตรวจรับงานแล้ว (ส่งมอบงานแล้ว รอส่งเอกสารเบิกจ่ายเงิน)
- 1.7 รพ.กะปงชัยพัฒนา จำนวน 1 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง (ส่งมอบงานแล้ว รอส่งเอกสารเบิกจ่ายเงิน)
- 1.8 รพ.ทับปุด จำนวน 1 แห่ง (ส่งมอบงานแล้ว รอส่งเอกสารเบิกจ่ายเงิน)
- 1.9 รพ.ท้ายเหมืองชัยพัฒนา จำนวน 1 แห่ง (อยู่ระหว่างนัดตรวจรับงาน วันที่ 20 ธันวาคม 2564)

รายการคงเหลือ (ต่อ)

2. งานปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ชนิดมีระบบกรองอากาศ จำนวน 3 แห่ง (357,800 บาท)

2.1 รพ.คุระบุรีชัยพัฒนา จำนวน 1 แห่ง
(ส่งมอบงานแล้ว รอส่งเอกสารเบิกจ่ายเงิน)

2.2 รพ.กะปงชัยพัฒนา จำนวน 1 แห่ง
อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง (ส่งเบิกจ่ายเงิน ภายในวันที่ 17 ธ.ค.64)

2.3 รพ.เกาะยาวชัยพัฒนา จำนวน 1 แห่ง
(ส่งมอบงานแล้ว รอส่งเอกสารเบิกจ่ายเงิน)

รายการคงเหลือ (ต่อ)

3. งานปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19แบบห้องแยกการติดเชื้อทางอากาศ หอพักผู้ป่วยมีห้องน้ำ

จำนวน 2 แห่ง (3,666,200 บาท)

3.1 รพ.เกาะยาวชัยพัฒน์ จำนวน 1 แห่ง

อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้าง และส่งมอบงานโดยเร็ว (คาดว่าจะสามารถส่งเบิกจ่ายเงินได้ภายใน ธ.ค.64)

3.2 รพ.ตะกั่วทุ่ง จำนวน 1 แห่ง

อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง (ส่งเบิกจ่ายเงิน ภายในวันที่ 15 ธ.ค.64)

รายการคงเหลือ (ต่อ)

4. งานปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID - 19 จำนวน 1 แห่ง (939,000 บาท)

4.1 รพ.ทับปุด จำนวน 1 แห่ง

(ส่งมอบงานแล้ว รอส่งเอกสารเบิกจ่ายเงิน)

5. งานปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID – 19 ชนิดมีระบบกรองอากาศ จำนวน 1 แห่ง (2,685,700)

5.1 รพ.ท่ายเหมืองชัยพัฒนา จำนวน 1 แห่ง

อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้าง และส่งมอบงานโดยเร็ว (คาดว่าจะสามารถส่งเบิกจ่ายเงินได้ภายใน ธ.ค.64)
